

Lillevilla 128-0

Blokhut met 19 mm wanddikte
Fundering 2.100 mm x 2.100 mm



Beste klant,
Lees deze handleiding helemaal door, voordat u uw blokhut opbouwt. Indien iets niet duidelijk is, dient u eerst advies in te winnen bij de verkoper.

Als u vervangende onderdelen nodig hebt, gebruik dan de onderdelenlijst in deze handleiding en vul hierop zeker het garantienummer in, voordat u de lijst voor de verdere afhandeling aan uw verkoper geeft.

**Om een garantiegeval te melden,
hebt u een garantiecode nodig.
Die vindt u op de laatste pagina van
deze montagehandleiding en op een
sticker op de verpakking van
de blokhut!**


Controle in de fabriek door: _____

Verder:

Voor de opbouw van de blokhut zijn bepaalde houtbewerkingsvaardigheden vereist. Met plezier raden wij u een professioneel montageteam aan.


Neem de algemene en lokale bouwvoorschriften in acht en zorg ervoor dat de funderingen en bevestigingen voldoen aan wat is voorgeschreven!

Deze zijn niet meegeleverd.

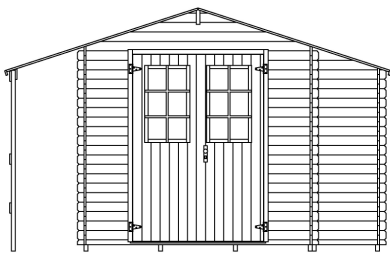

Wandplanken	19 mm x 87 mm
Fundering	2.100 mm x 2.100 mm
Buitenmaat wanden	2.200 mm x 2.200 mm
Dakoppervlakte	9,7 m ²
Nokhoogte	2.260 mm
Deurbladafmeting	1.200 mm b/1.700 mm h
Gewicht	402 kg


Deze gegevens kunnen licht afwijken.

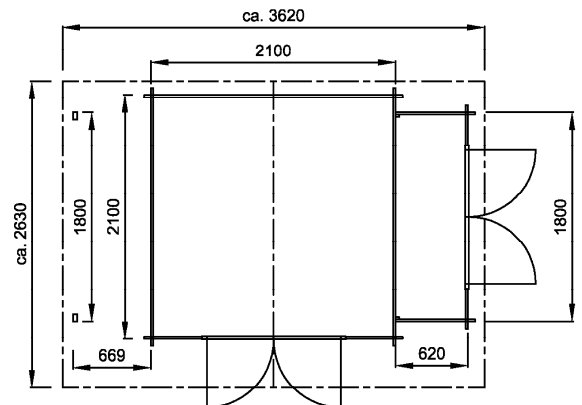

Plattegrond en funderingsplan (6 funderingsbalken)

Funderingsbalk 1-4 = 36 x 60 x 2.100 mm

Funderingsbalk 5-6 = 36 x 60 x 1.800 mm

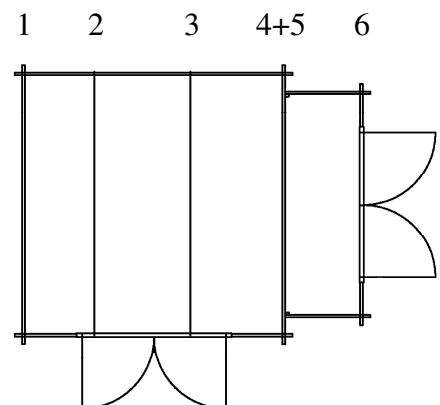

Frequente fouten bij de constructie van blokhutten

Sommige van onderstaande problemen met blokhutten doen zich doorgaans voor bij het warmere weer tijdens de eerste lente na de opbouw.

Neem daarom deze instructies reeds bij de montage van de blokhut in acht!

Fout	Gevolg	Oplossing
De montagehandleiding werd niet gelezen of nageleefd.	De complete blokhut kan hierdoor worden beïnvloed en in waarde verminderen zonder dat de fabrikant of verkoper hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.	Lees de montagehandleiding compleet en zorgvuldig door. Indien u vragen hebt of iets niet duidelijk is, dient u eerst advies in te winnen bij de verkoper.
Er werd niet tijdig (ca. 2-3 dagen) vóór het begin van de opbouw gecontroleerd of de bouwset compleet en in perfecte staat is.	Bij de opbouw werd vastgesteld dat onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. De opbouw kan niet begonnen of voltooid worden.	Controleer de bouwset vóór het begin van de montage-werkzaamheden. In geval van gebreken vult u die in op de onderdelenlijst en raadpleegt u uw verkoper. Vervangende onderdelen ontvangt u doorgaans binnen enkele werkdagen.
Tijdens de opbouw werd vastgesteld dat bepaalde onderdelen defect zijn. Deze onderdelen werden toch gebruikt.	De complete blokhut kan hierdoor worden beïnvloed en in waarde verminderen zonder dat de fabrikant of verkoper hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.	Controleer de bouwset vóór het begin van de montage-werkzaamheden. In geval van gebreken vermeldt u die op de onderdelenlijst en raadpleegt u uw verkoper. Vervangende onderdelen ontvangt u doorgaans binnen enkele werkdagen.
Er werden stellingen of kasten in de blokhut geplaatst en op verschillende wandplanken vastgeschroefd of -gespijkerd. Er werden elektriciteitskabels aangebracht en met kabelklemmen bevestigd.	Er ontstaan spleten in de wanden, de complete blokhut trekt scheef.	Kasten en stellingen mogen aan slechts één wandplank worden bevestigd. Elektriciteitskabels of kabelkanalen mogen niet aan de wandplanken worden bevestigd.
Dak- en/of vloerplanken werden te strak in elkaar geschoven.	De dak- en of vloerconstructie zet uit in vochtige perioden en komt omhoog.	Schuif de dak- en/of vloerplanken niet te strak in elkaar, zodat er enige speling blijft.

Na de montage werd geen of onvoldoende schimmelwerende primer aangebracht.	De blokhut vertoont zwarte verkleuringen en schimmel.	Als de schimmel zo sterk is, dat hij niet meer met schuurpapier enz. kan worden verwijderd, moet de blokhut dekkend worden geschilderd.
In de hoeken van de blokhut werd silicone aangebracht.	Vocht kan niet meer goed opdrogen. De blokhut vertoont vochtplekken of schimmel.	Verwijder de silicone uit de hoekverbindingen en gebruik voor de afdichting een slaglijst die max. aan één wandplank mag worden bevestigd.
De dakplanken werden omgekeerd aangebracht. De ontspanningsgroef is zichtbaar in de blokhut.	De 'lelijke kant' is zichtbaar in de blokhut. Evt. vocht dat in de dakconstructie dringt, wordt niet correct afgevoerd. Het dak kan beschadigd raken.	Installeer de dakplanken met de ontspanningsgroef naar boven (naar buiten).
In plaats van houtbeits of houtbeschermingsmiddel met open poriën werd dikke houtbeits of verzegelende verf zoals bootlak gebruikt.	Het hout kan niet correct drogen. Er stapelt zich vocht op in het hout. Er treedt vroegtijdige verrotting op in de blokhut.	Gebruik uitsluitend houtbeits met open poriën of andere geschikte houtbeschermingsmiddelen.
Algemeen		Gebruik in geval van een reclamatie uitsluitend de onderdelenlijst in de montagehandleiding. Zo worden misverstanden voorkomen.

Al onze bouwsets bestaan uit Noors naaldhout dat technisch gedroogd en chemisch onbehandeld is (met uitzondering van de funderingsbalken).

Wijzigingen van de schaaftprofielen, schaaftbreedten en afmetingen in de loop van de productie zijn voorbehouden.

Dit geldt niet voor de vermelde wand-, dak- en vloerdikten. De funderingsmaat van de blokhutten wordt hierdoor niet beïnvloed.

Alle vermelde afmetingen kunnen afwijken.

Voor een probleemloos gebruik en lange levensduur dient de blokhut correct opgeslagen, gemonteerd, onderhouden en gerepareerd te worden. Omdat hout een natuurlijk materiaal is, heeft elk houten onderdeel een eigen structuur en patroon.

De volgende karakteristieke kenmerken van hout zijn toegestaan en kunnen dus geen reden voor reclamatie vormen:

- vast vergroeide noesten in het hout, geen doorlopende gaten door losgekomen noesten in wandplanken
- af en toe voorkomende losgekomen noesten aan de rand of kleine noesten
- schaafsporen en wankanten op de achterkant van de dak- en vloerplanken, op voorwaarde dat het zichtbare vlak afgesloten kan worden verwerkt
- barsten zonder invloed op de constructie (volgens DIN/VOB)
- eventuele kleine harszakken met een lengte van max. 5 cm
- vervormingen, op voorwaarde dat het hout verder kan worden verwerkt

Van iedere garantie uitgesloten zijn gebreken door:

- niet correct geconstrueerde funderingen
- funderingen die niet waterpas zijn
- het afwijken van de montage-instructies zoals voorgeschreven in de montagehandleiding
- gebrekkig onderhoud en het gebruik van een niet-vochtregulerend beschermingsmiddel
- het afwijken van de instructies van de fabrikant bij het gebruik van houtbeschermingsmiddelen
- gebrekkige, onvakkundig geïnstalleerde of onvoldoende dakbedekking
- gevolgschade door onvakkundig aan-, in of verbouwen
- ontbrekende of verkeerd geïnstalleerde stormbeveiliging
- natuurrampen of andere gewelddadige invloeden
- windsnelheden van meer dan 7 beaufort

Neem in acht dat onderdelen die niet aan de bovenstaande bepalingen voldoen, niet mogen worden gebruikt. Men dient tijdig vóór de montagewerkzaamheden te controleren of de bouwset compleet en in perfecte staat is. Garantieclaims zijn beperkt tot de vervanging van gebrekkige materialen binnen een redelijke periode. Gebrekkige onderdelen die reeds gemonteerd en/of behandeld zijn, en schade als gevolg daarvan komen niet in aanmerking voor reclamaties of vervanging en eventuele verdere claims.

In geval van een reclamatie dient u de betrokken onderdelen op de onderdelenlijst aan te duiden en die lijst samen met uw garantiecode voor verdere afhandeling aan uw verkoper te overhandigen.

Wij proberen u dan zo snel mogelijk vervangende onderdelen te bezorgen.

Wij hopen dat u begrijpt dat het transport enige tijd in beslag kan nemen. Over de manier waarop claims worden geregeld, heeft de bouwmarkt als uw verkoper het beslissingsrecht.

Vooraf wat informatie over hout: Ons materiaal is zuiver natuurlijk. Massief hout kan vocht opnemen en afgeven. Daarom kan het zich optimaal aanpassen aan verschillende weersomstandigheden. Ondanks de technische droging en een correcte bescherming blijft het altijd in het eerste seizoen 'leven en werken' volgens de verschillende weersinvloeden. Bij hoge vochtigheid zal het uitzetten (waardoor de wanden enkele centimeters 'groeien'), om dan in droge omstandigheden weer te krimpen. Daarom is ook het scheefftrekken van planken, het vrijkomen van hars en het vormen van barsten – vooral aan de kopse kanten, maar ook op vlakken – niet helemaal uit te sluiten. Dat geldt ook voor verschillen door noesten en loskomende noesten.

Ons hout (dat natuurlijk afkomstig is uit Noorse bossen die duurzaam worden beheerd) is met uitzondering van de geïmpregneerde onderdelen compleet

onbehandeld. Daardoor zal het in de loop van de jaren vergrijzen. Dat kunt u voorkomen door het te behandelen met gepigmenteerde houtbeits of met dekkende verf. Raadpleeg hiervoor de adviseur in uw bouwmarkt: daar kunt u kiezen uit een groot aanbod.

Behandel de wandplanken niet vóór de montage. U doet dat het beste bij droog weer nadat de blokhut compleet geïnstalleerd is. Als de onderdelen vóór de montage worden geïmpregneerd, zal het technisch gedroogde hout vocht opnemen. Dat kan natuurlijke vervormingen en uitzettingen veroorzaken, waardoor de installatie onnodig wordt bemoeilijkt.

Als grondlaag dient u voldoende schimmelwerende primer aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant. De blokhut moet direct na de ontvangst worden gemonteerd. Voordat u met de montage begint of een montagebedrijf daartoe de opdracht geeft, dient u tijdig te controleren of de bouwset compleet en in perfecte staat is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten en schade als gevolg van een gebrekkige controle, ook op volledigheid!

Voor de opbouw van de blokhut zijn bepaalde houtbewerkingsvaardigheden vereist. Met plezier raden wij u een professioneel montageteam aan. Neem de algemene en lokale bouwvoorschriften in acht en zorg ervoor dat de funderingen en bevestigingen voldoen aan wat is voorgeschreven! Deze zijn niet meegeleverd.

Uw blokhut moet worden verankerd op een voldoende grote en correct uitgevoerde fundering als bescherming tegen opwaartse wind- en zuigkrachten.

Overigens: een goede ventilatie en het voorkomen van stuwvocht is nog altijd de beste bescherming voor hout tegen verrotting! Wij wensen u veel succes bij de montage en jarenlang plezier van uw nieuwe tuinhuis.

Laten we eraan beginnen!




Let op! Hout is een natuurlijk product, dat tijdens het transport en de opslag aan verschillende invloeden blootgesteld kan zijn. Controleer daarom of de bouwset compleet is en alle onderdelen in perfecte staat zijn, voordat u met de opbouw begint of deze uitbesteedt aan een bedrijf of particuliere personen. Gebruik geen onderdelen die zichtbaar beschadigd of af te keuren zijn! Voor het versturen van evt. beschadigde onderdelen dient u, afhankelijk van het type en de grootte, rekening te houden met een periode van enkele werkdagen.




Tekening 1


Blokhut voorwand A

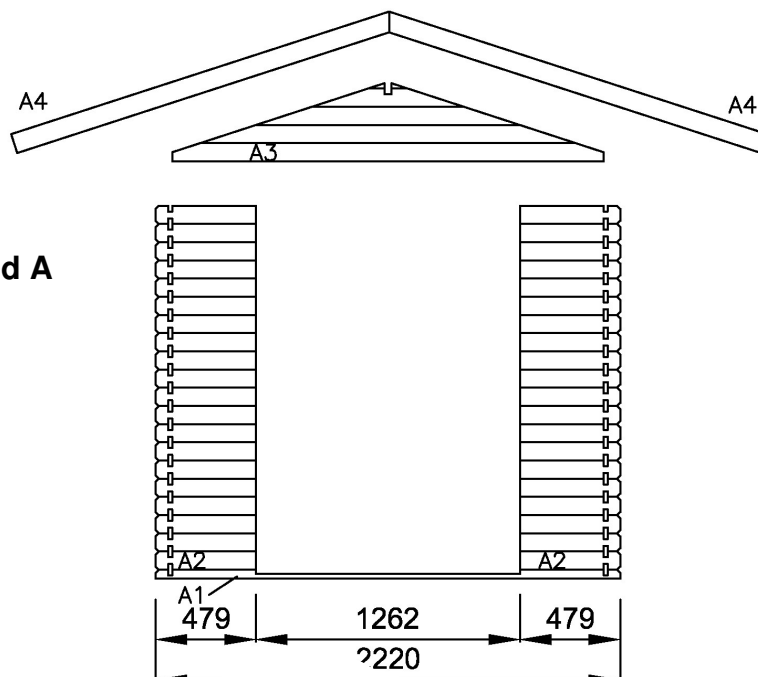


Blokhut achterwand B

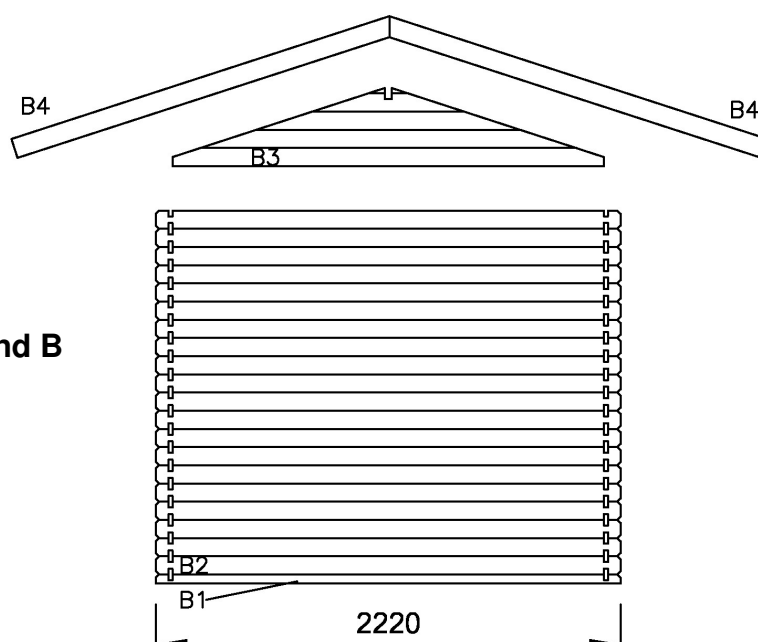


Blokhut zijwanden

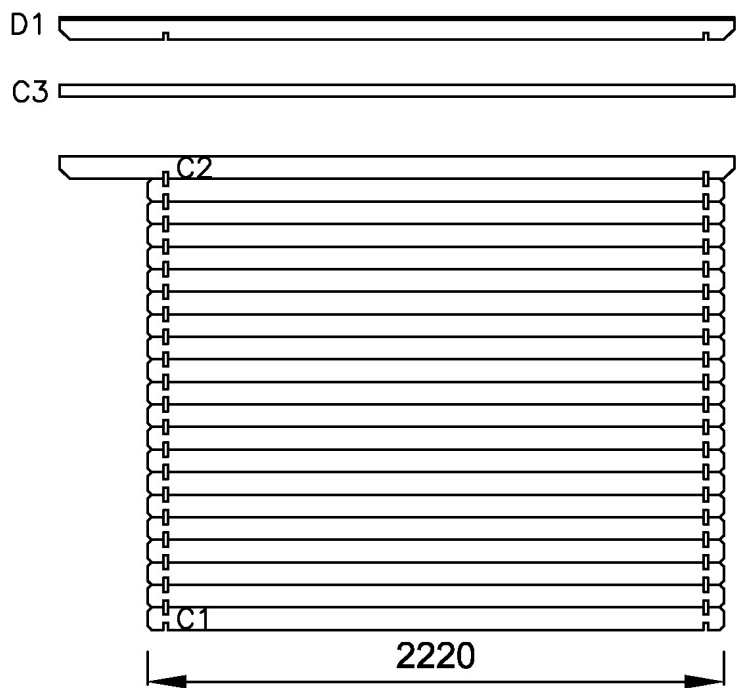


Deur blokhut

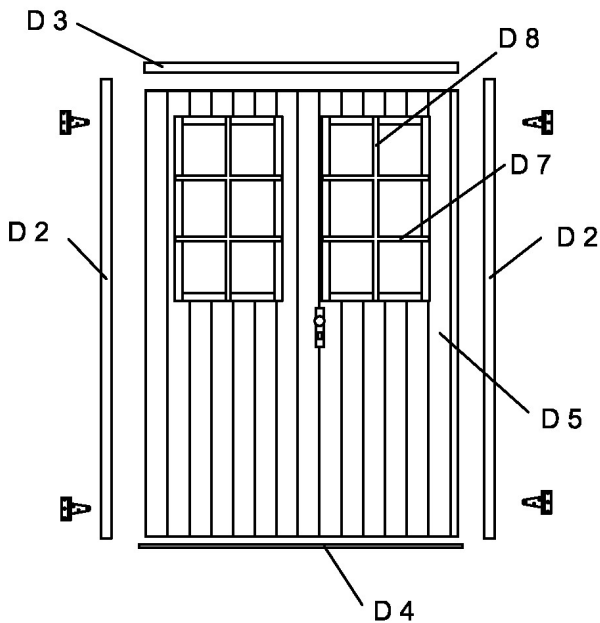


Aanbouwkast

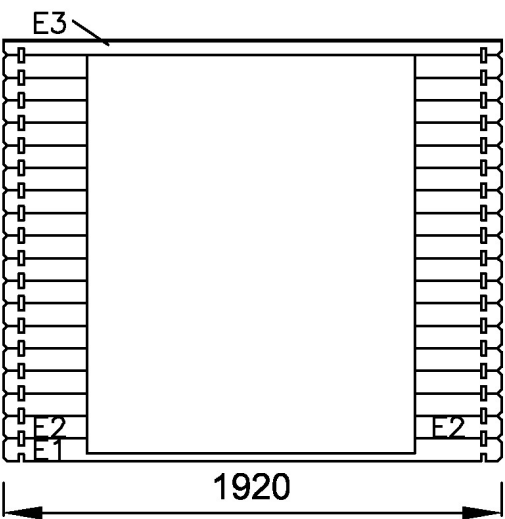

Deur aanbouwkast

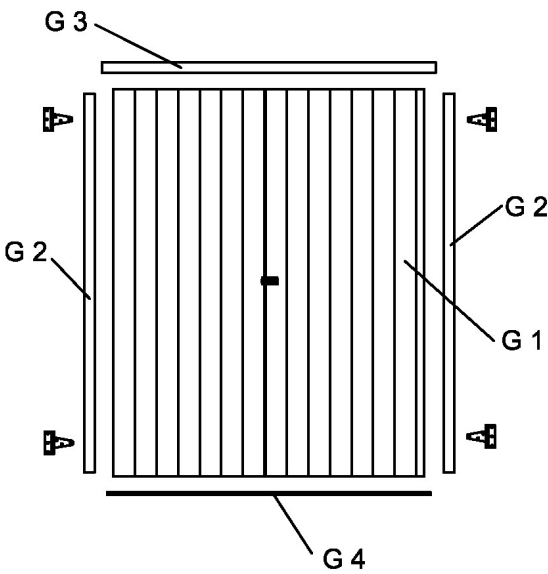

Zijdeel




1. Fundering

De stabiliteit, functie en levensduur van uw blokhut worden in hoge mate bepaald door de fundering.

Alleen een perfect waterpas geïnstalleerde fundering met voldoende draagvermogen garandeert een optimale stabiliteit en perfecte zitting van de planken, de dubbele deur en het afdak.

Tekening 2

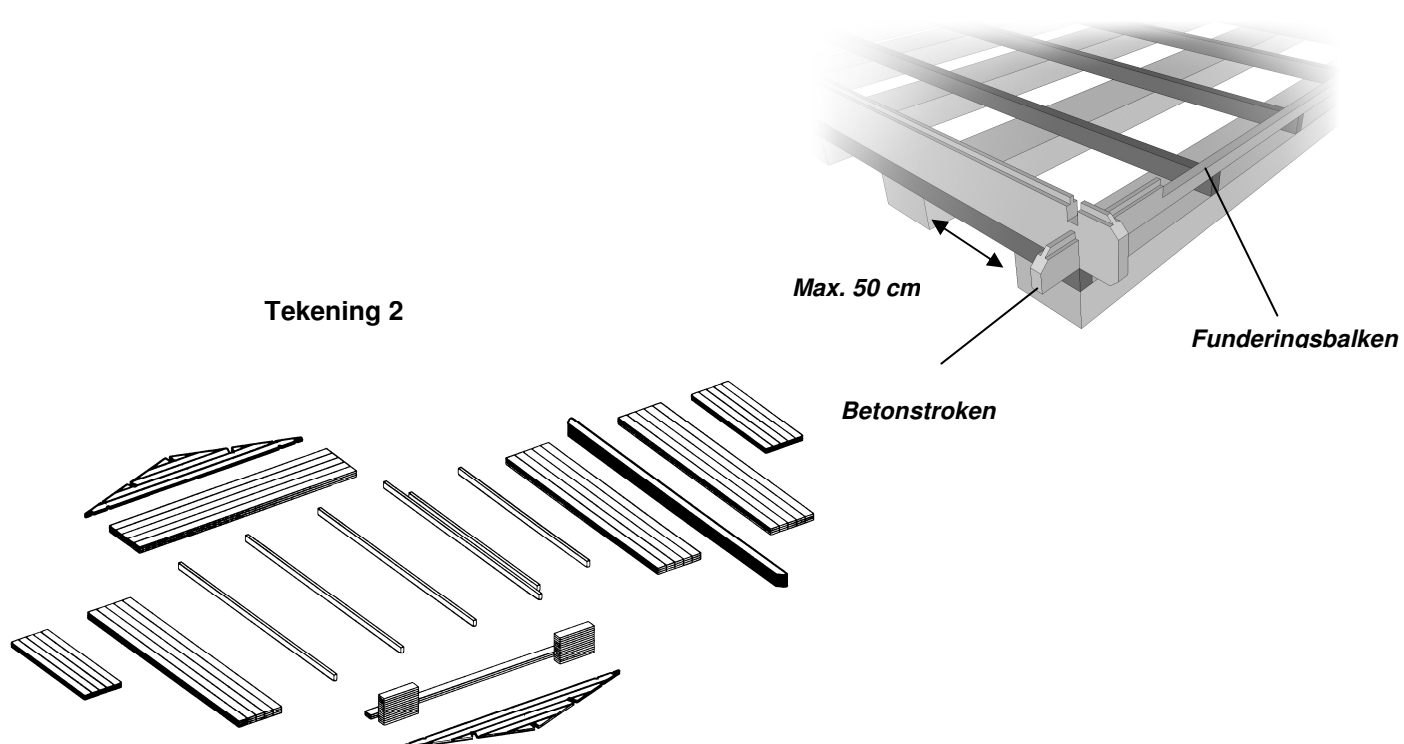

2. Sorteren

Laat u bij het openen van het pak niet afschrikken door het op het eerste gezicht verwarrend grote aantal onderdelen. Sorteer ze en alles wordt veel eenvoudiger!

3. Opbouw van de wanden en inbouw van de dubbele deur

Orden de onderdelen gesorteerd per complete wand en leg ze op 1-2 m afstand (als werkruimte) rond de fundering. Tekening 2

Voordat u met de opbouw van de wanden begint, dient u de 4 geïmpregneerde funderingsbalken van 2,10 m op ongeveer gelijke afstand van elkaar en een funderingsbalk van 1,80 m voor de aanbouw op uw fundering te leggen.

De funderingsbalken moeten volgens de statische berekening met geschikte inslagankers of vergelijkbare verbindingsmiddelen op de strokenfundering worden bevestigd. De balken zijn wel geïmpregneerd, maar voor de zekerheid moet u toch een strook bitumenkarton (niet in de levering inbegrepen) of folie tussen de fundering en de funderingsbalken aanbrengen als bescherming tegen opstijgend vocht.

Raadpleeg tekening 1 voor de opbouw van de wanden.

Steek eerst de onderste wandplanken (2 halve wandplanken - 44 mm A1 en B1 voor de voor- en achterwand en 2 hele planken – 87 mm C1 voor de zijwanden) in elkaar. Let erop dat wandplank A1 een uitsparing voor de dubbele deur heeft.

Net als bij de rest van de montage is een rubberen hamer hier een handig hulpmiddel.

Sla nooit direct op de messing, om schade te voorkomen. Wij leveren montageblokjes van 19 x 60 x 250 mm bij de bouwset. Steek ze op de messing als bescherming tegen de impact. Ook bij de plankuiteinden die over de hoeken uitsteken, dient u voorzichtig te werk te gaan om afsplinteren te voorkomen!

Als toch een stuk plankuiteinde zou afbreken, heeft dat geen negatieve gevolgen en kan het gemakkelijk met wat houtlijm worden gerepareerd.


Dit 'frame' toont u de grootte van de blokhut en zo kunt u de funderingsbalken gemakkelijk exact positioneren. Let er goed op dat de hoeken van de wanden perfect recht zijn!

Bevestig de eerste plankenlaag met dunne schroeven in de hoekverbindingen op de funderingsbalken. Boor voorzichtig voor, om de planken niet te beschadigen! Tekening 4

De uiteindelijke stabiele verbinding tussen de fundering en de blokhut ontstaat door de latere installatie van de vloer en de plinten, die afwisselend op de vloerdelen en de zijwanden worden bevestigd.

Zorg ervoor dat de hoeken perfect recht zijn!


Tekening 4

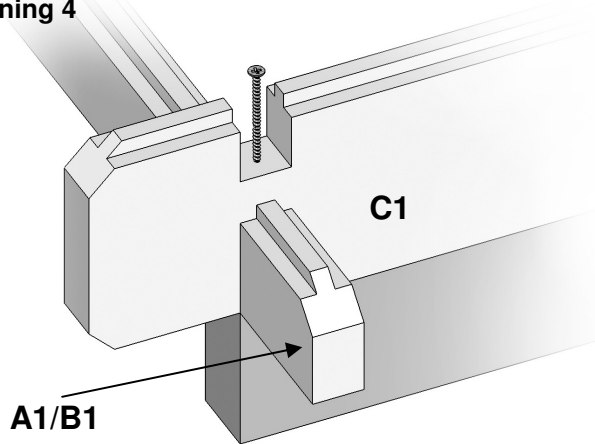

En nog iets:

De zijwanden moeten ca. 2-3 mm over de funderingsbalken uitsteken. Dit creëert een druiprand en beschermt tegen vocht. In ieder geval moet men erop letten dat aan de binnenkant een voldoende grote rand vrij blijft om de vloerdelen veilig op te installeren. Tekening 3.

Tekening 3

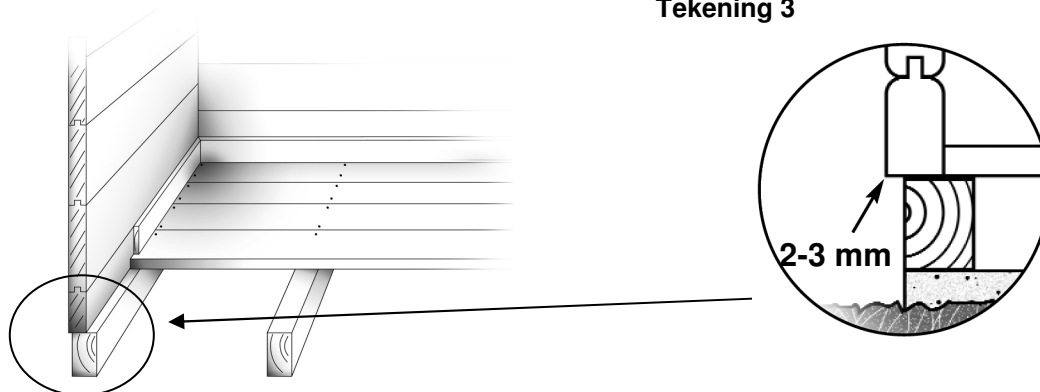


Construeer nu volgens tekening 1 de wanden laag per laag verder tot de 6e zijwandplank.

Let erop dat de zijwanden met de langere planken C2 worden afgesloten.


De voorwand wordt met de vooraf gemonteerde puntgevel A3 afgesloten. Installeer vervolgens de vooraf gemonteerde achterpuntgevel B3 voorzichtig, om het afbreken van de uiteinden te voorkomen. Let ook op een gelijkmatige afsluiting van de bovenste wandplanken. Pas eventueel afzonderlijke wandplanken aan in de hoogte.

Als er toch een uiteinde zou afbreken, kunt u dat gemakkelijk weer vastplakken, nadat de blokhut is gemonteerd. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de constructie.

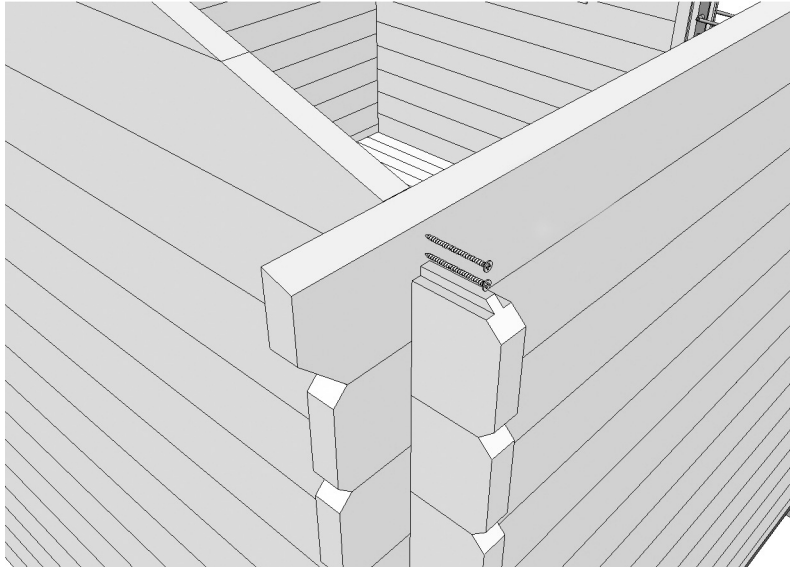


Als in elke hoek van de blokhut de bovenste zijplanken telkens met twee schroeven goed zijn vastgemaakt op de puntgevels, wordt het deurkozijn gemonteerd.

Eerst wordt de metalen drempel in het midden van de deuruitsparing gelegd en met drie schroeven door de voorgeboorde gaten op de onderste wandplank A1 bevestigd.

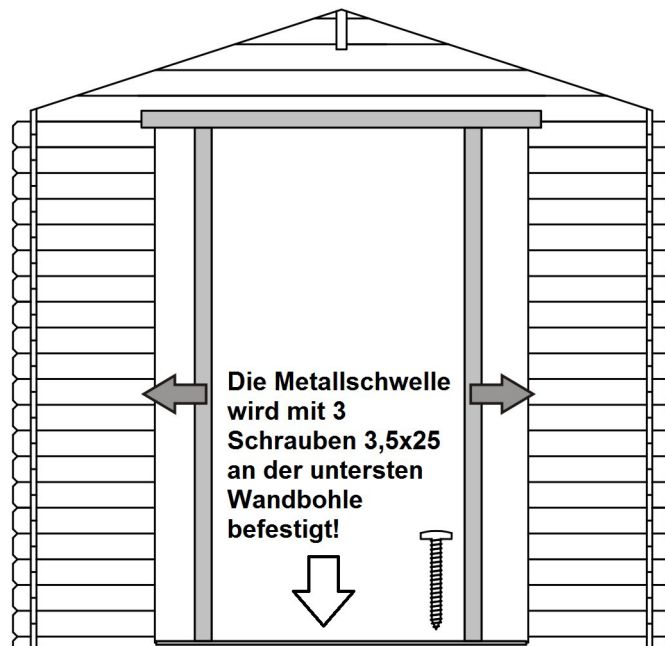

De twee zijdelen en het bovendee van het kozijn bestaan telkens uit twee lijsten. Deze lijsten, bijv. 2 x G2 voor een zijdeel of 2 X G3 voor het bovendee, worden in de vorm van een U met schroeven 3,5 x 35 met elkaar verbonden.


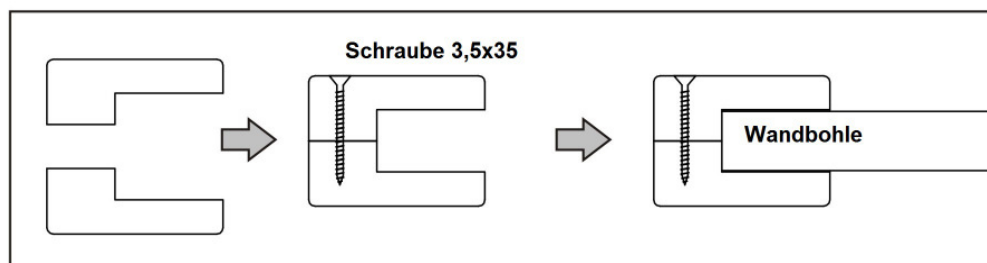




Dan plaatst u de gemonteerde kozijndelen zo tegen de wandplanken, dat het U-profiel van de kozijndelen de buitenranden van de wandplanken omsluit.

Let erop dat de hoeken van het deurkozijn precies 90° zijn.

Dat kunt u eenvoudig controleren door de diagonaal van de linker onderhoek tot de rechter bovenhoek te meten. Deze waarde moet identiek zijn aan de afstand tussen de rechter onderhoek en de linker bovenhoek.

De afstand tussen de linker en de rechter kant moet bovenaan en onderaan precies 1.215 mm bedragen.

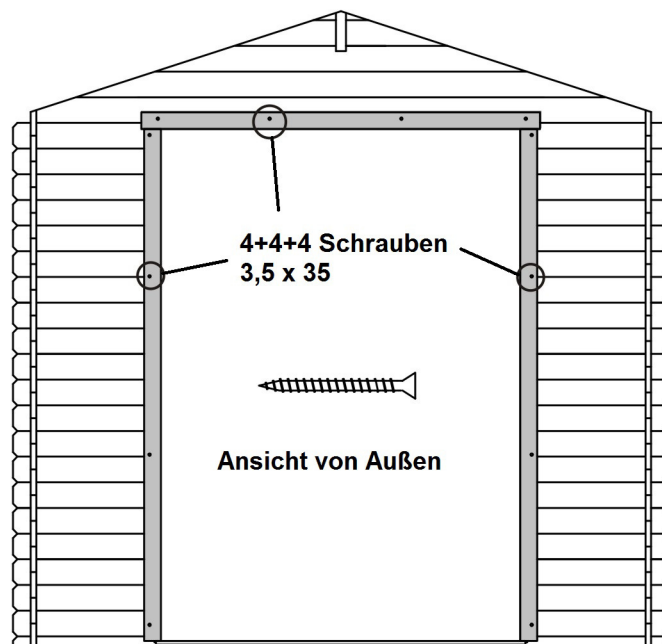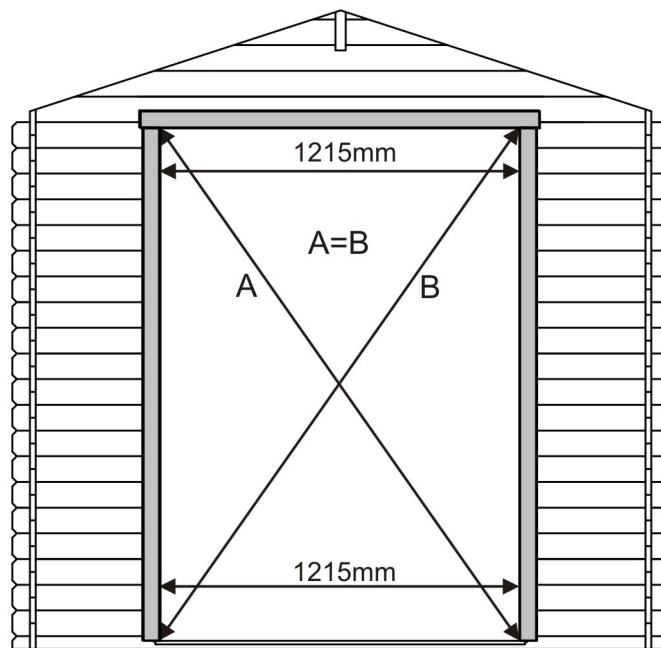

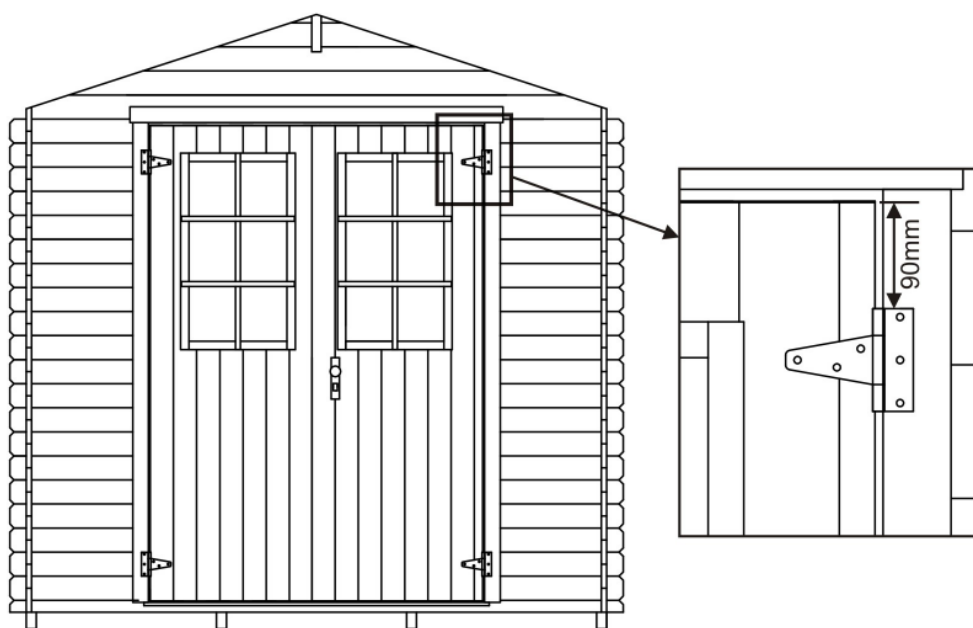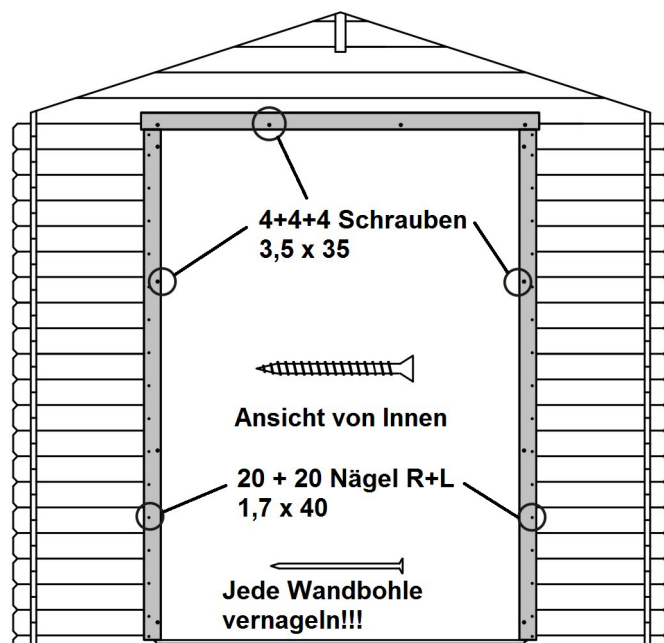


4. Vloer

***De vloerdelen zijn voorzien van een messing en groef.
De onderkant herkent u aan de ontspanningsgroef
(ingefreesde sleuf)***

Neem in acht dat net als bij de profielplanken van de dakbedekking om productietechnische redenen schaaffouten en wankanten op de achterkant zijn toegestaan. Ze kunnen dus geen reden vormen voor een reclamatie.

Losgebroken noesten aan de randen moeten bij de vloerdelen worden geaccepteerd. Een gedeeltelijk afgebroken messing kan eveneens voorkomen, maar zal geen probleem veroorzaken bij het afsluiten van de vloer.

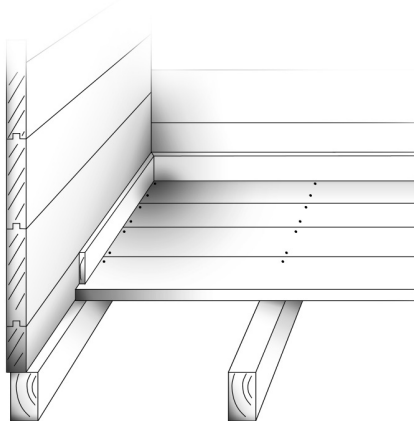

Tekening 3

Begin bij de installatie van de vloer aan de voorwand. De groef van de eerste plank wordt naar de wand gericht. Let er ook op dat de planken goed op de funderingsbalken van de zijwanden worden gelegd. Tekening 3

Installeer de vloer deel per deel en pas daarbij telkens de messing in de groef, om het vlak af te dekken en te sluiten.

Als het vlak mooi gelijk en afgesloten is, worden de vloerdelen met schroeven of spijkers goed op de funderingsbalken bevestigd. Pas vervolgens de plinten aan volgens de wanden en breng ze rondom aan. Voor extra bescherming tegen opwaartse wind- en zuigkrachten moeten de plinten afwisselend op de vloerdelen en wandplanken vastgeschroefd of -gespijkerd worden.

Boor de gaten voor!

5. Montage van de aanbouwkast

Eerst wordt een funderingsbalk van 36 x 60 x 1.800 mm op de funderingsbalk van de zijwand bevestigd (natuurlijk ook veilig steunend op de door u voorbereide fundering). Tekening E

Aangezien de aanbouwkast smaller is dan de wand van de blokhut, kunt u kiezen waar u de kast positioneert: meer naar de voorwand of meer naar de achterwand.

Begin nu met de constructie van de kastwanden met de twee halve wandplanken F1 19 x 44 x 680 mm. Steek ze in de onderste wandplank E1 19 x 87 x 1.920 mm (met uitsparing voor het deurkozijn) en plaats dit 'frame' zo tegen de wand van de blokhut, dat het goed en veilig op beide funderingsbalken steunt. Spijker de plank E1 met de uitsparing vast op de funderingsbalk.


Om de zijwanden van uw kast op de blokhutwand te bevestigen, worden twee wandaansluitingslijsten 28 x 28 x 1.800 mm (inkorten tot op 179 cm) exact loodrecht (waterpas!) op de blokhutwand geschroefd.

Let op: leg eerst een vloerdeel (18 x 87 x 600 mm) tegen de halve wandplanken. De wandaansluitingslijsten worden op deze vloeredelen geïnstalleerd.


Bevestig de lijsten eerst met twee schroeven, om correcties mogelijk te maken. Uiteindelijk moeten ze zich in de aanbouwkast bevinden.

Spijker de halve wandplanken F1 vast op de lijsten en

Tekening E

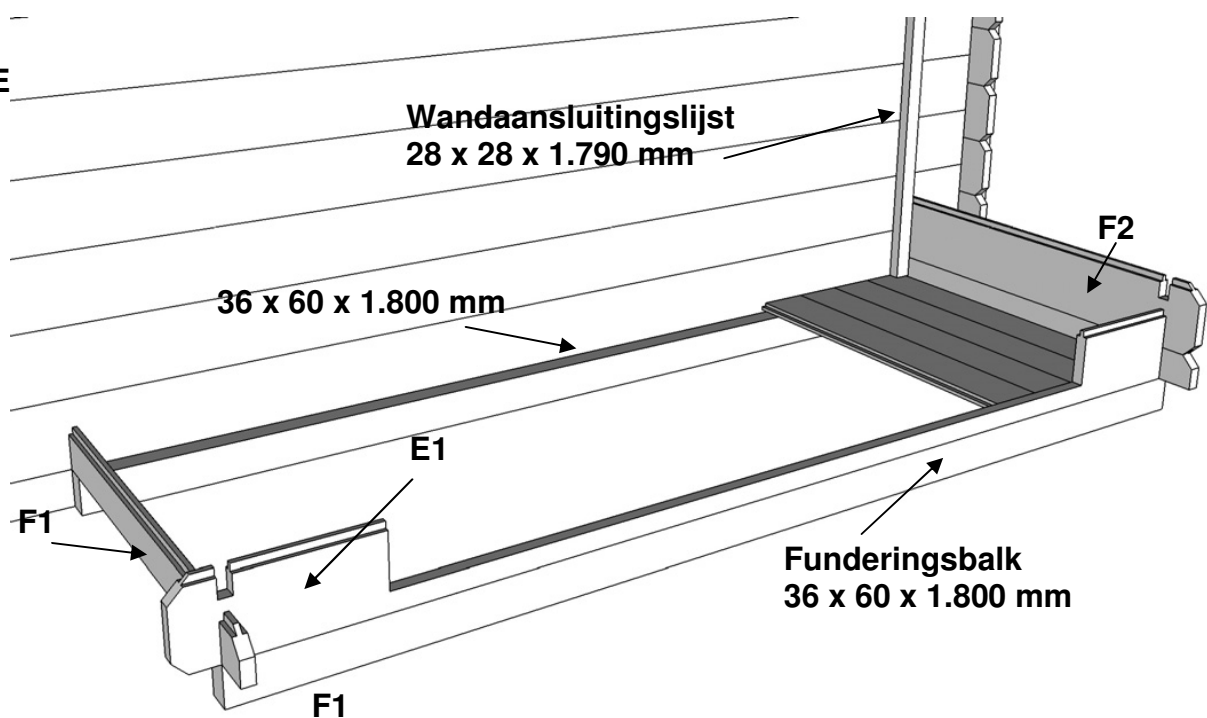

begin dan met de constructie van de kastwanden, zie tekening 1 en E, D, F. De opbouw verloopt net als bij de blokhut. Na enkele planken dient u met de 3 lijsten 2 x G2 en 1 x G3 en de metalen drempel het deurkozijn te monteren en in de uitsparing in de wand te installeren. Tekening D.

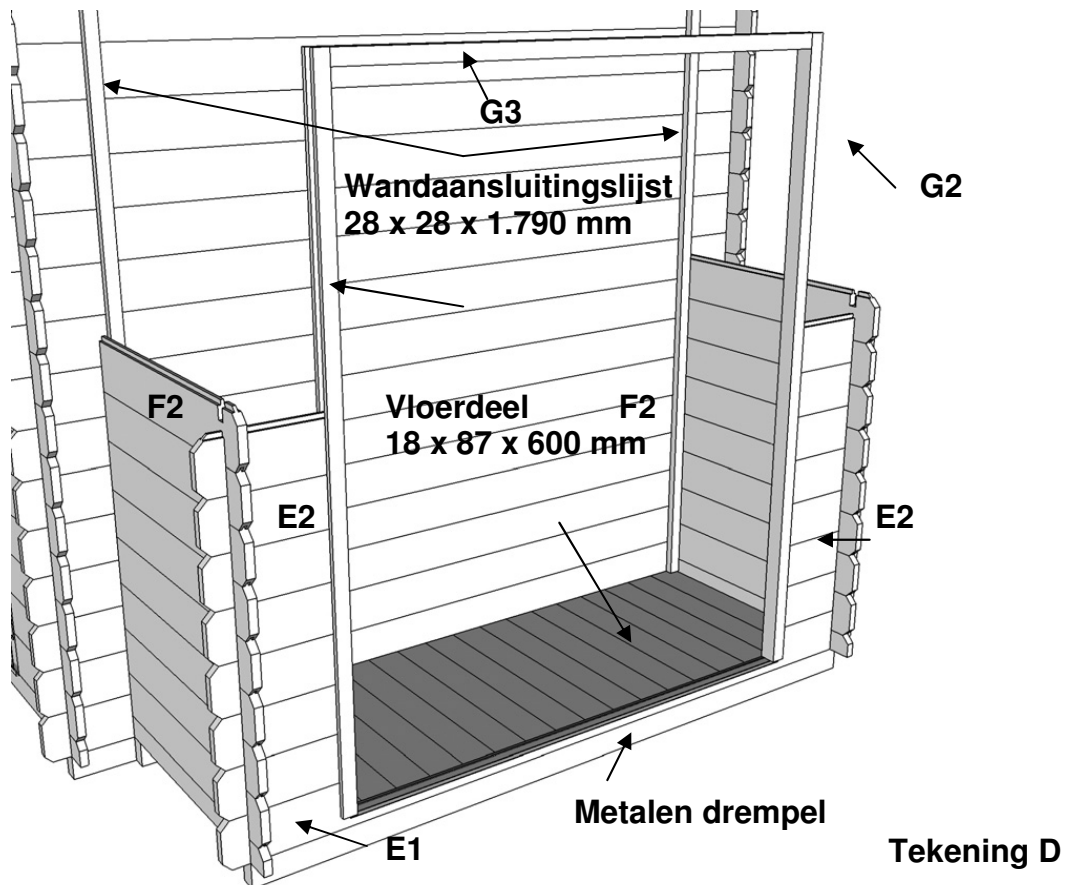

Bouw de wanden verder op en sluit de deuruitsparing af met de plank E3. Richt het kozijn uit en bevestig de deurvleugels met de scharnieren zoals beschreven bij de blokhutdeur. De zijwanden worden met de geveldriehoek F3 afgesloten. Tekening 1.



Pas de planken hierbij zo aan, dat de aansluiting met het dak van de blokhut perfect is en de messing-en-groefverbindingen van de wandplanken gelijkmatig zijn (evt. bijwerken). Tekening F.

Als alle wandplanken gelijkmatig en mooi in elkaar passend zijn gepositioneerd, spijkt u elke zijwandplank vast op de wandaansluitingslijst, en dat precies loodrecht op de wandplanken van de blokhut. Als de deur goed is gepositioneerd, spijkt u ook het deurkozijn vast op elke wandplank E2.

Installeer nu de vloerdelen, positioneer ze correct en spijker ze vast. Zaag de plinten op maat en installeer ze rondom. Inkepingen aan de uiteinden van de plinten hebben geen functie en worden bij het op maat zagen verwijderd.


7. Dak

Begin met de plaatsing van de nokgording D1 in de bovenste uitsparing van de puntgevels. Hij mag niet boven de gevels uitsteken. Om aan de statische eisen te voldoen, moeten de gordingen met behulp van schroeven of 2 schuine spijkers aan de puntgevels worden bevestigd.

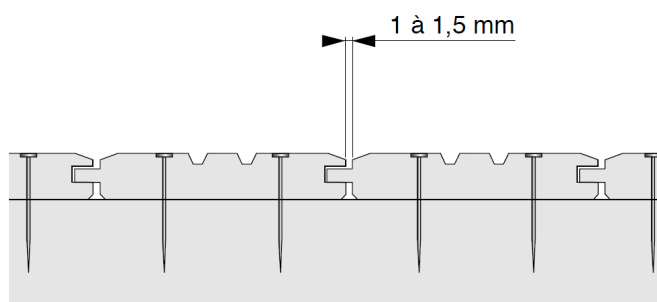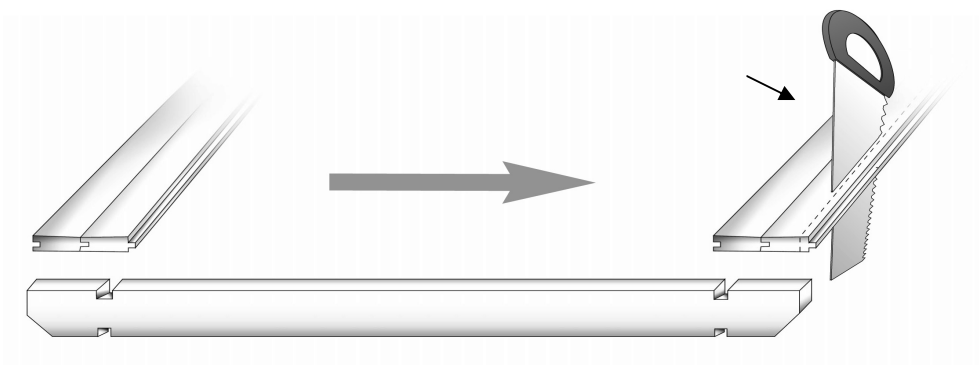

9. Stormbeveiliging

Gebruik hiervoor spijkers van 40 mm lang. Boor de lijsten licht voor en plaats ze nauw aansluitend in de hoeken. Spijker de lijsten plank per plank vast, en dat afwisselend op de zijwand en de achterwand. Als het deurkozijn nog niet bevestigd is, spijker het dan nu vast op elke wandplank.

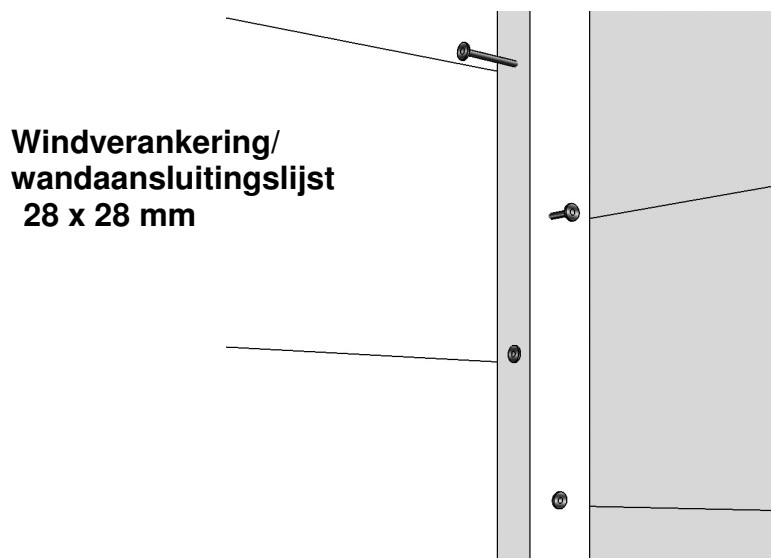

Binnen


Tekening 7b

Nu zijn de wanden vastgezet. Maar toch zullen de wanden bij elke seizoensverandering een beetje blijven 'werken'. Onder invloed van de wisselende vochtigheid zullen de planken in warme periodes in de breedte een beetje 'krimpen' of kleiner worden en dan in vochtige periodes weer uitzetten.

Een stabiele en vaste verbinding tussen de fundering, de blokhut en het dak is ook zeer belangrijk voor de duurzaamheid.


9. Afdak

Werk nu het afdak aan de zijkant af.

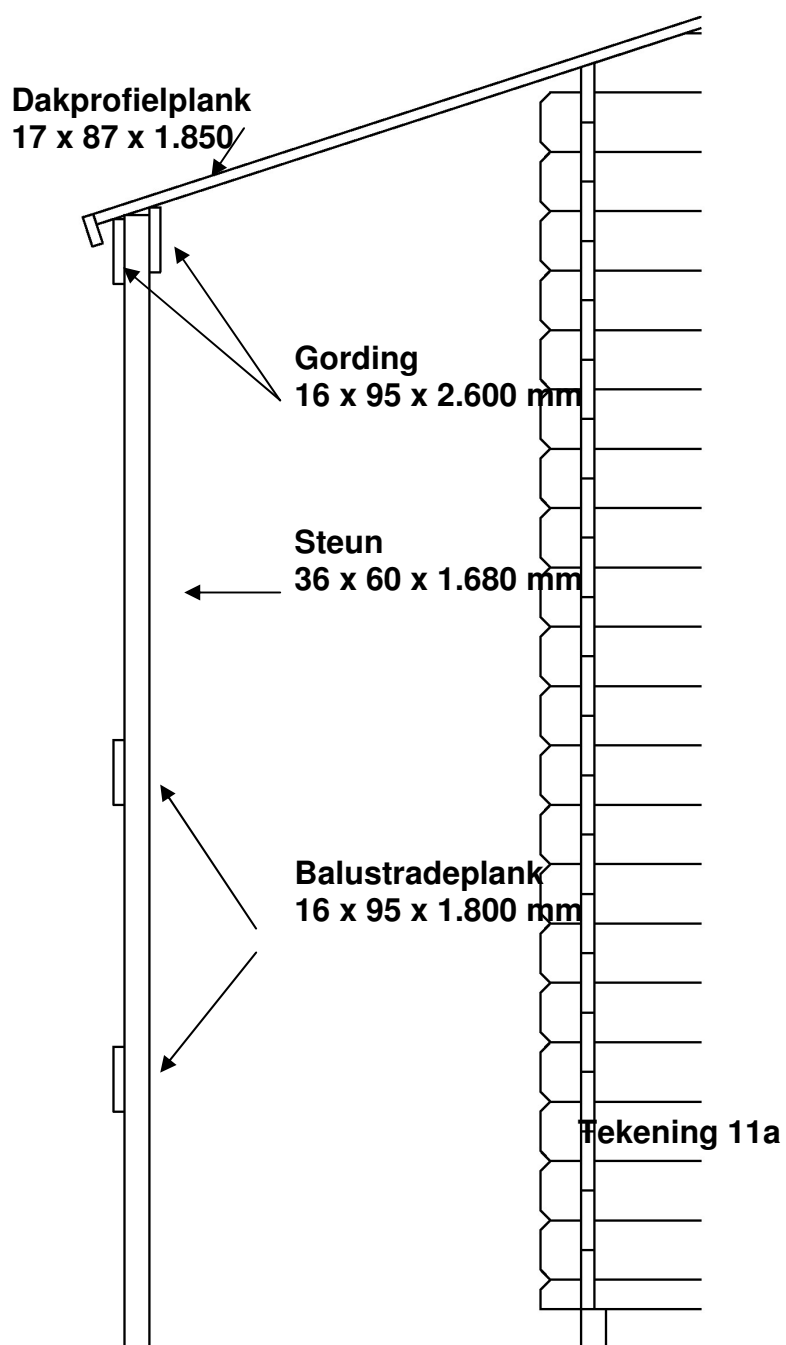

De positie van de gordingen bepaalt de lengte van de steunpalen.

Uw bouwset bevat 2 balustradeplanken 16x95x1800 mm. Die moeten zoals op tekening 11c weergegeven op de steunpalen worden vastgespijkerd. Ze zorgen voor extra stabiliteit en een praktische afbakening. De steunpalen moeten veilig op uw fundering worden bevestigd.

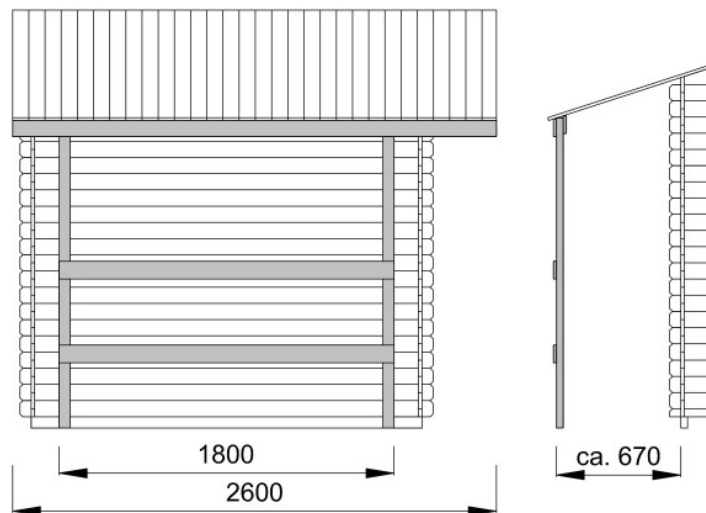


Tekening 11b

Tekening 11c

10. Dakbedekking

Werk veilig! Het dak is niet begaanbaar!

Bevestig de druiplijsten C3 nu zodanig, dat ze gelijklopen met de dakvlakken. Tekening 6.

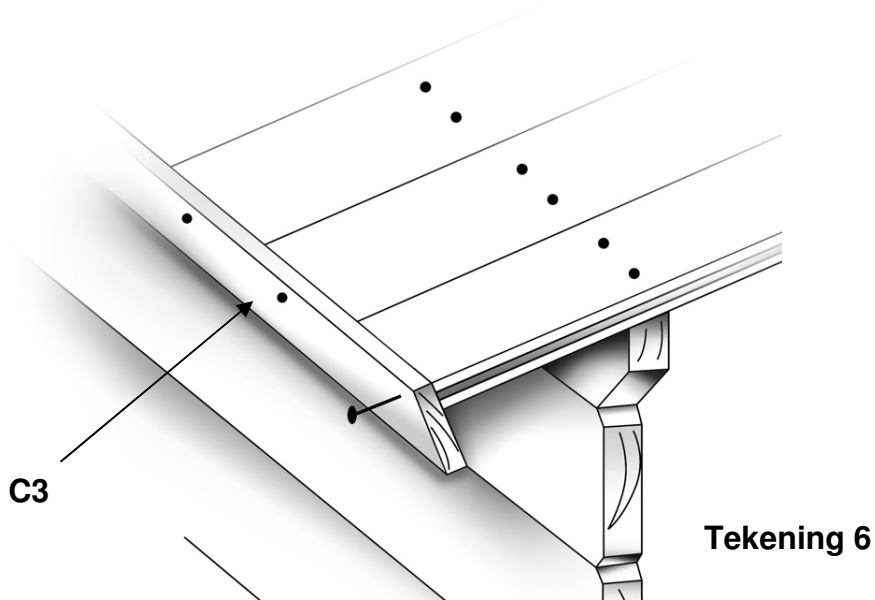

De dakplanken moeten met telkens 2 spijkers aan de gordingen/zijwanden worden bevestigd.

Daarna volgen de windveren A4/B4.

De duurzaam weerbestendige en betrouwbaar lekdichte uitvoering van het dak is medebepalend voor de levensduur van uw blokhut.

Informeer u bij uw verkoper over de verschillende mogelijkheden.



Bij de dakplanken (en dit geldt ook voor de vloerplanken) mag de messing niet te strak in de groef worden geschoven. Laat een beetje speling, zodat het hout kan werken en de dakconstructie niet omhoogkomt of welft!

Wij raden aan om ook een dakgoot aan te brengen.

11. Afwerking

Bevestig het beslag op de deuren.

Plaats dan de plexiglasruiten met de kozijnlijsten voor de uitsparingen in de deur (aan de buitenkant!), zorg dat alles goed gepositioneerd is en schroef alles vast.

Voor de afdichting raden wij silicone aan. Monteer de kruisroeden, die met de lijsten D7 en D8 worden gevormd.

12. Bescherming en onderhoud van hout

Als u uw blokhut wilt kleuren, dient u dat, zoals reeds vermeld, na de montage te doen.

Wij raden aan om een gepigmenteerde houtbeits met open poriën te gebruiken. Verzegelende producten of dikke verflagen zijn niet geschikt. Deze kunnen tot schimmelvorming en vroegtijdige verrotting leiden en zo aanzienlijke schade aan de blokhut veroorzaken!

Om verkleuringen te voorkomen, dient u eerst voldoende schimmelwerende primer (raadpleeg de gebruiksinstructies van de fabrikant) aan te brengen, ook in de hoekverbindingen. Dit moet in de eerste 10 dagen na de opbouw bij droog weer gebeuren.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Afmetingen van afzonderlijke onderdelen kunnen licht afwijken van de afmetingen die in de onderdelenlijst worden vermeld. Deurbeslag en sloten kunnen afhankelijk van het productieproces verschillen. Afwijkingen van de catalogusafbeeldingen zijn mogelijk. Dak- en vloerplanken moeten desgevallend tot op dezelfde lengte worden afgekort. Evt. inkepingen aan de uiteinden van de plinten hebben geen functie en moeten bij het op maat zagen worden verwijderd.

Bovenstaande punten kunnen geen reden zijn voor reclamaties.

Onderdelenlijst (1/2) Lillevilla 128-0 19 mm 2.100 mm x 2.100 mm

Beschrijving	Afmetingen in mm ca.	Aantal	Marke- ring	Controle
Funderingsbalk	36 x 60 x 2.100	4		
Vloerdeel	16 x 87 x 2.057	24		
Plint in verschillende afmetingen	ca. 28 x 28 o.m.	8 str. m		
Wandplank met uitsparing voor deur	19 x 44 x 2.220	1	A 1	
Wandplank	19 x 87 x 479	40	A 2	
Geveldriehoek	19 x 375 x 2.062	1	A 3	
Windveer	16 x 95 x 1.900	2	A 4	
Wandplank	19 x 44 x 2.220	1	B 1	
Wandplank	19 x 87 x 2.220	20	B 2	
Geveldriehoek	19 x 375 x 2.062	1	B 3	
Windveer	16 x 95 x 1.900	2	B 4	
Wandplank	19 x 87 x 2.220	20+20	C 1	
Wandplank, 18 graden	19 x 87 x 2.600	1+1	C 2	
Druiplijst	16 x 45 x 2.600	1+1	C 3	
Nokgording	34 x 135 x 2.600	1	D 1	
Kozijn voor deur, zijkant	21 x 57 x 1.732	4	D 2	
Kozijn voor deur, bovenkant	21 x 57 x 1.350	2	D 3	
Metalen drempel	12 x 37 x 1.253	1	D 4	
Deur met raam, type J3	1.200 x 1.720	1	D 5	
Roede, horizontaal	18 x 18 x 410	4	D 7	
Roede, verticaal	18 x 18 x 710	2	D 8	
Kozijnlijst voor raam, horizontaal	12 x 30 x 355	4	D 9	
Kozijnlijst voor raam, verticaal	12 x 30 x 710	4	D 10	
Plexiglas	2 x 375 x 670	2	D 11	
Dakbedekking, profielplank	16 x 87 x 1.850	60		
of				
Dakbedekking, profielplank	16 x 72 x 1.850	72		
Windverankering	28 x 28 x 1.800	4		
Montageblokje	250 mm lang	2		
Schroeven, spijkers enz.		1 zakje		

Garantienummer hier:

!

Vul dit blad in en overhandig het aan uw verkoper voor verdere afhandeling:

Reclamatie: _____ Naam: _____

Adres: _____

Tel.: _____

Onderdelenlijst (2/2) Lillevilla 128-0 19 mm 2.100 mm x 2.100 mm

Beschrijving	Afmetingen in mm ca.	Aantal	Marke-ring	Controle
Kast en afdak				
Wandplank	19 x 87 x 1.920	1	E 1	
Wandplank	19 x 87 x 329	34	E 2	
Wandplank, 18 graden	19 x 60 x 1.920	1	E 3	
Wandplank	19 x 44 x 680	1+1	F 1	
Wandplank	19 x 87 x 680	17+17	F 2	
Geveldriehoek	19 x 300 x 680	1+1	F 3	
Funderingsbalk	36 x 60 x 1.800	2		
Vloerdeel	16 x 87 x 600	21		
Plint	28 x 28	5 str. m		
Wandaansluitingslijst	28 x 28 x 1.800	4		
Steun afdak (paal)	36 x 60 x 1.680	2		
Gording, horizontaal	16 x 95 x 2.600	2		
Balustradeplank	16 x 95 x 1.800	2		
Dubbele deur, type R3	1.200 x 1.495	1	G 1	
Kozijn voor deur, zijkant	21 x 57 x 1.510	4	G 2	
Kozijn voor deur, bovenkant	21 x 57 x 1.350	2	G 3	
Metalen drempel	12 x 37 x 1.253	1	G 4	

Garantienummer hier:

Vul dit blad in en overhandig het aan uw verkoper voor verdere afhandeling:

Reclamatie: _____ Naam: _____

Adres: _____

Tel.: _____

Afgehandeld door: _____

Adviseur: _____

Adres: _____
